


Separatkloakering Fayesgade m.fl.
Mariagerfjord vand A/S
Gunnar Nielsen A/S

Id	Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Tidsplan														
						24	sep 20 31	07	14	21	okt 20 28	05	12	19	26	nov 20 02				
1	?	<u>Separatkloakering af Fayesgade m.fl.</u>																		
2	?	Dato: 08-09-2020																		
3	?	Færdiggørelse af projekt																		
4	→																			
5	→	Kloakarbejder	32 dage?	fr 11-09-20	sø 25-10-20															
6	?																			
7	?	Kloakhold 1																		
8	→	A11R060 - A11F065 3,5m	5 dage	ma 21-09-20	fr 25-09-20															
9	→	A12S108 - A11F405 2,9m	5 dage	ma 14-09-20	fr 18-09-20															
10	?																			
11	→	Belægningsarbejder	25 dage	ma 14-09-20	fr 16-10-20															
12	→	Skovvej	25 dage	ma 14-09-20	fr 16-10-20															
13	→	Grøndalsvej overkørsel	5 dage	ma 28-09-20	fr 02-10-20															
14	?																			
15	?	Kabler VERDO																		
16	→	Nedgravning af kabler Skovvej	14 dage	ma 14-09-20	to 01-10-20															
17	→	Nedgravning af kabler Blåkildevej	7 dage	on 14-10-20	to 22-10-20															
18	?																			
19	→	Asfaltering	11 dage	ma 12-10-20	ma 26-10-20															
20	→	Skovvej	2 dage	ma 12-10-20	ti 13-10-20															
21	→	Grøndalsvej	2 dage	fr 23-10-20	ma 26-10-20															

Projekt Tidsplan

Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			

Separatkloakering Fayesgade m.f.l.
 Mariagerfjord vand A/S
 Gunnar Nielsen A/S

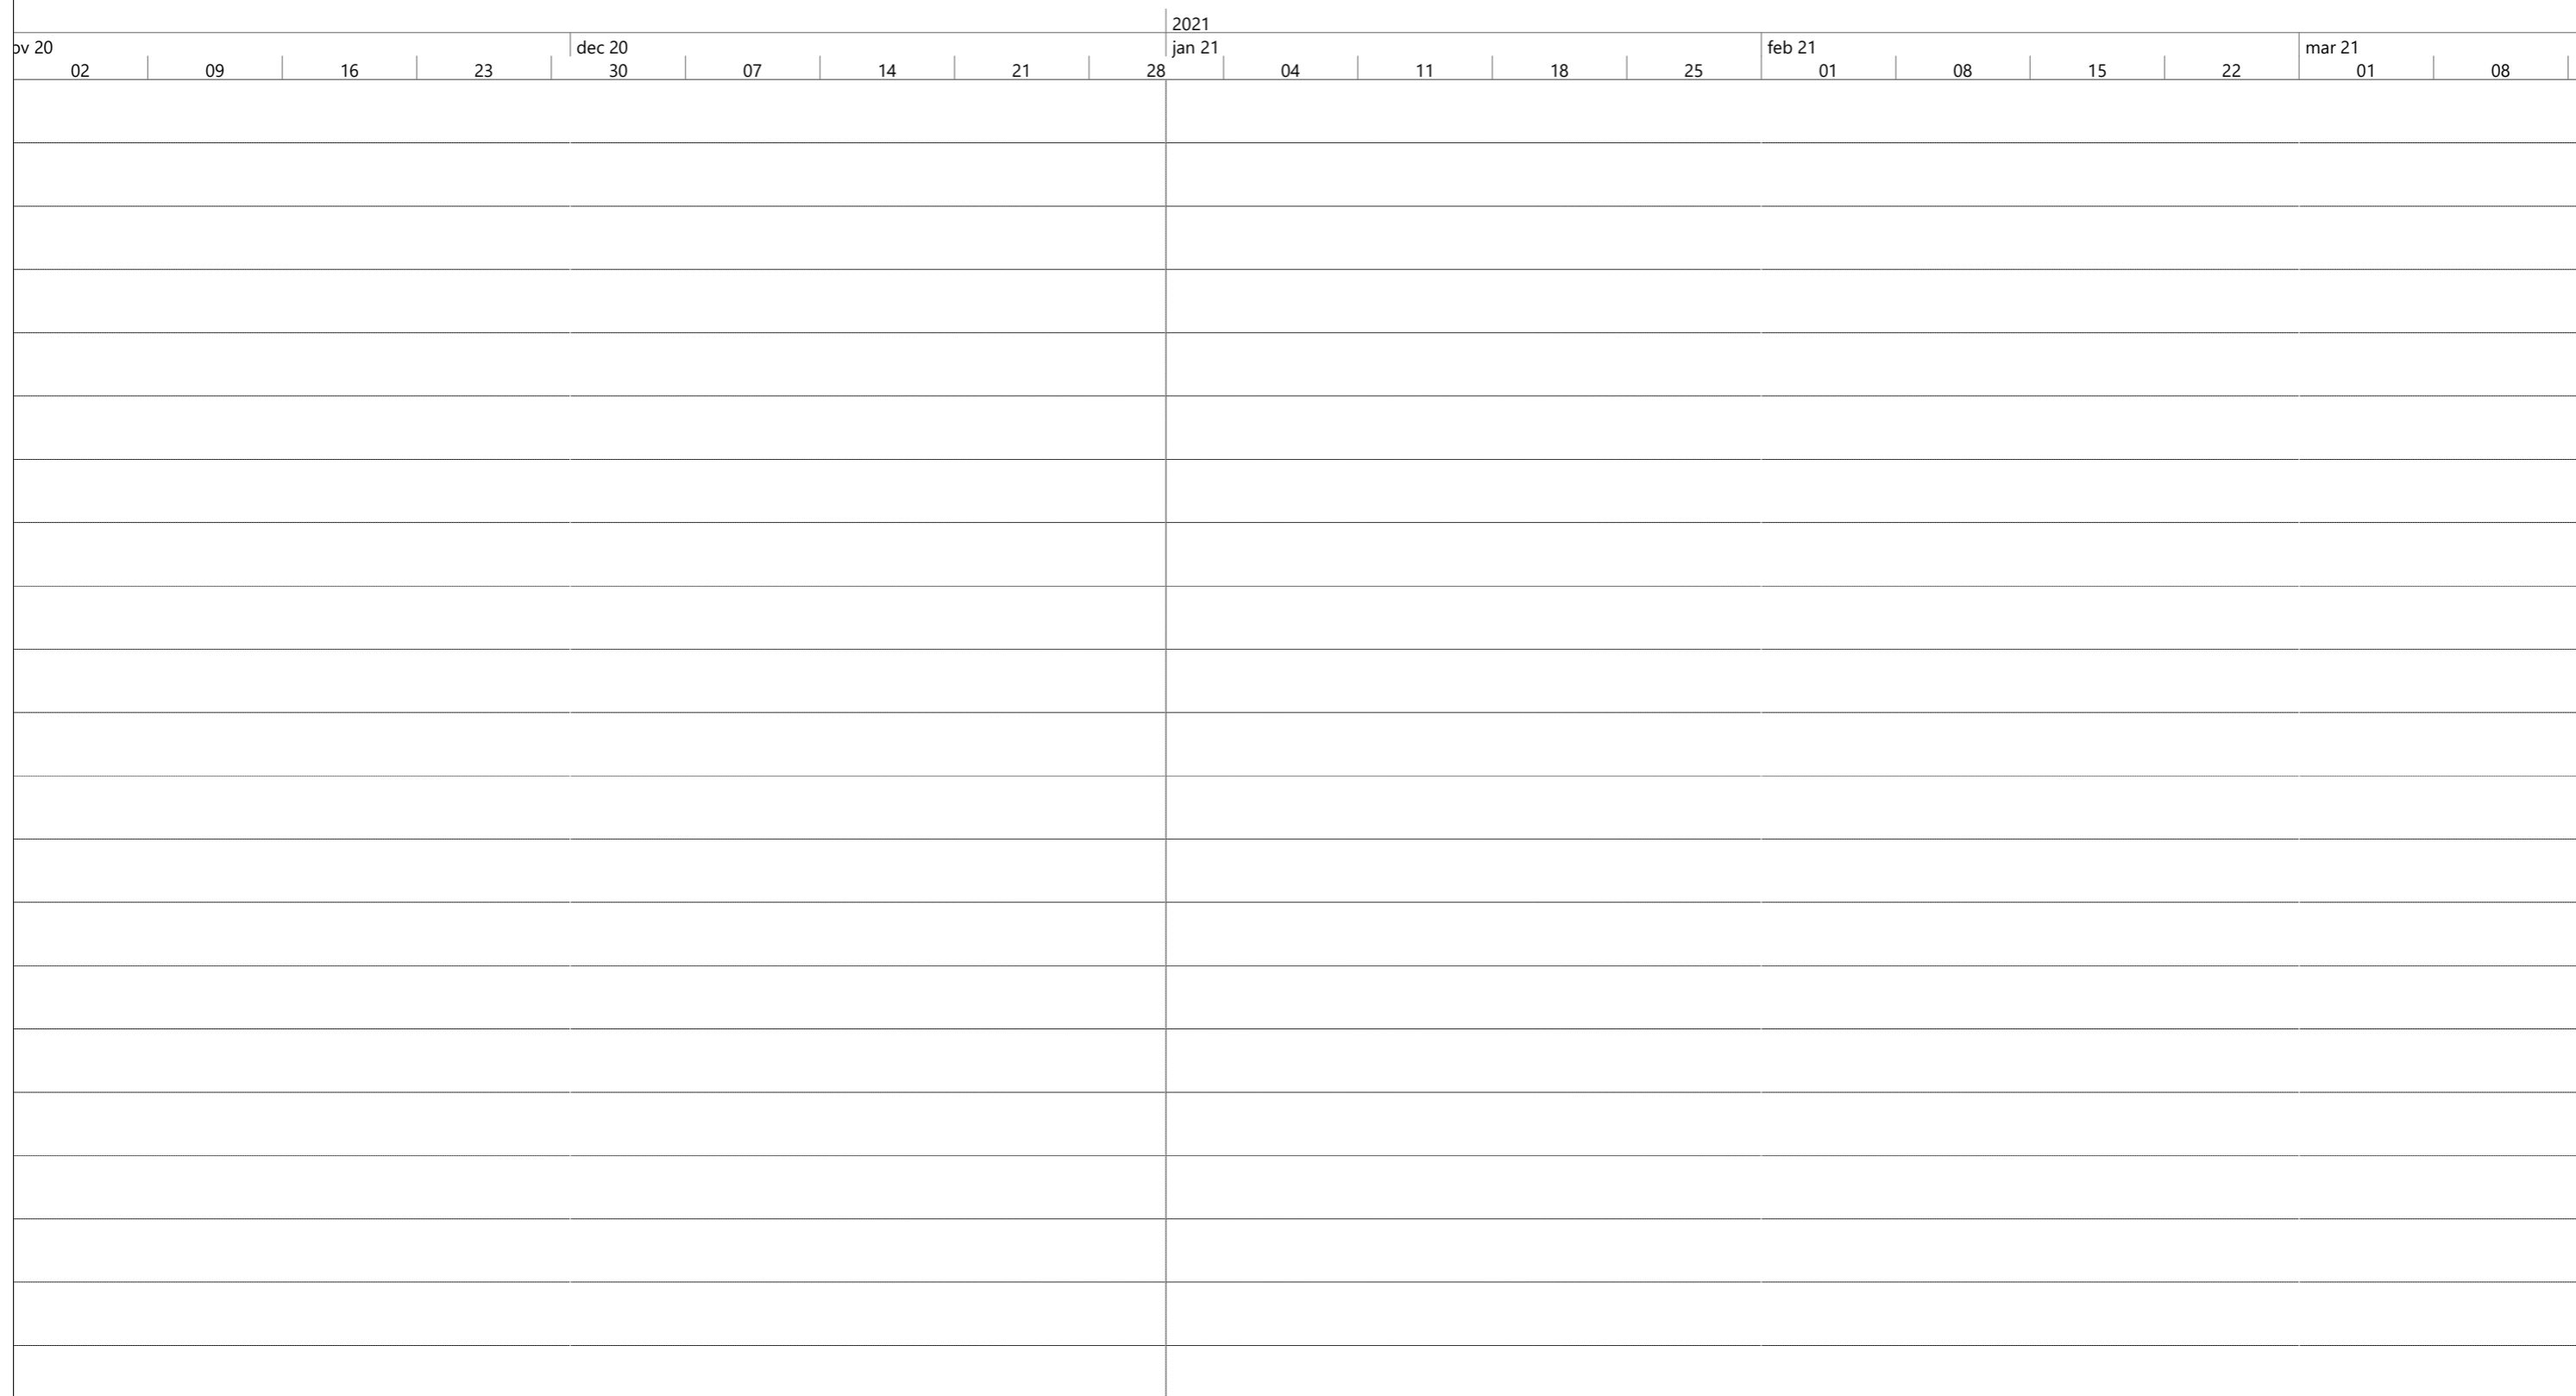

Projekt Tidsplan	Opgave		Projektoversigt		Manuel opgave		Kun start		Deadline	
	Opdeling		Inaktiv opgave		Kun varighed		Kun slutdato		Fremdrift	
	Milepæl		Inaktiv milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Eksterne opgaver		Manuel status	
	Hovedopgave		Inaktiv oversigt		Manuel oversigt		Ekstern milepæl			
