

REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand A/S

Dato Mandag den 31. marts 2025 kl. 16:00 til 19:00
Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Jens Riise Dalgaard, Per Kragelund, Jesper Skov Mikkelsen, Verner H. Kristiansen, Preben Weller, Brian Basse, Per F. Olesen og Kim Baade Christiansen.

Afbud
Mødet sluttede Kl. 19.00

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
V 08 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)	2
V 09 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
V 10 - Årsregnskab 2024 for MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	4
V 11 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 (Åben)	5
V 12 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben)	6
V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) ..	8
V 14 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)	17
V 15 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)	21
V 16 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)	25
V 17 - Sommerhuskloakering (Åben)	26
V 18 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)	28
V 19 - Dagsorden til generalforsamlingen d. 30. april 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	29
V 20 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	30
V 21 - Eventuelt (Åben)	32
V 22 - Næste møde (Åben)	33
V 23 -. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	34
Underskriftsside	35

V 08 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)

Velkommen til første bestyrelsesmøde i MFV, hvor MFV er et datterselskab til RenForM. Mødet er det andet møde jævnfør Forretningsordenen, og her består bestyrelsen af 11 medlemmer.

I forbindelse med årsrapport 2024, deltager revisor Kristen Bertelsen, Beierholm i mødet, frem til og med pkt. V12.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Orienteringen taget til efterretning

V 09 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

Referatet fra bestyrelsesmødet 6. januar 2025 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 20. december 2024.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Referatet blev underskrevet.

V 10 - Årsregnskab 2024 for MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 11 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 (Åben)

Økonomiopfølgningen pr. februar 2025 for Mariagerfjord Vand (MFV) fremgår af bilag ”Punkt V11_bilag 1”, og er som i tidligere økonomiopfølgninger for MFF, opdelt i forretningsområderne/forsyningsarterne spildevand og vand.

Spildevand:

Årsestimat 2025 for MFV på spildevandsområdet vurderes på nuværende tidspunkt til et resultat på ca.+17.000 t.kr. mod et årsbudget på ca. +12.000 t.kr.

Forøgede adm. omkostninger indregnet i årsestimatet hos RenForM på ca. 1.300 t.kr. finansieres med 70% på MFV-spildevand, hvilket betyder en forøgelse i de estimerede interne omkostninger for spildevand på 889 t.kr. svarende til 7,7% forøgelse af de interne adm. omkostninger.

Dette modsvares af ca. 70.000 m³ ekstra faktureret spildevand, som udgør ca. 3.000 t.kr. og mindre driftsomkostninger til drift af HLR på yderligere ca. 3.000 t.kr.

Vand:

Årsestimat 2025 for MFV på drikkevandsområdet vurderes på nuværende tidspunkt til et resultat på ca.+1.700 t.kr. mod et årsbudget på ca. +850 t.kr.

Forøgede adm. omkostninger indregnet i årsestimatet hos RenForM på ca. 1.300 t.kr. finansieres med 10% af MFV-drikkevand, hvilket betyder en forøgelse i de estimerede interne omkostninger for drikkevand på ca. 130 t.kr. svarende til 14,0% forøgelse af de interne adm. omkostninger.

Dette opvejes af et mersalg på ca. 20.000 m³ som svarer til ca. 100 t.kr. og fortsat reduktion i driftsomkostningerne på ca. 900 t.kr.

Realiseret data for perioden januar og februar 2025

Grundet store udfordringer i det meste af januar og starten af februar måned med klargøring og tilretning af vores ERP system Business Central til de nye selskaber, er realiseret data for perioden januar til februar 2025 endnu ikke afstemt, om konteret og opdateret, og dermed ikke retvisende for nogle af de 3 selskaber.

Derfor har vi valgt **ikke** at medtage realiseret data for perioden.

Fokus i økonomiafdelingen i februar og marts måned har desuden også været på at færdiggøre regnskab 2024 for Mariagerfjord Vand (MFV).

Direktionen indstiller:

- **At økonomiopfølgningen for tages til efterretning**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:

Indstillingen godkendt.

V 12 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben)

Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025

Opdateret estimat på anlægsbudgettet pr. 23-3-25 vurderes på Vand **til 4,6 mio. kr.** og på Spildevand **til 104,5 mio. kr.** Disse vurderinger er nettobeløb som er inklusive.

indtægter fra tilslutningsbidrag, medfinansiering fra Mariagerfjord Kommune og øvrige indtægter på anlægsbudgettet.

Tidligere estimeret anlægsbudget pr. 16-12-24 var på 7,4 mio. kr. for Vand og 106,2 mio. kr. for Spildevand.

De opdaterede anlægsbudgetter fremgår af bilag ”Punkt V12_bilag 1”.

For HLR er der to store ekstra opgaver, der ikke var budgetsat ved budgetlægningen. Den ene er udskiftning af to dekantere (slutafvanding af slam) hvor de efter 11 år er så nedslidte at det er uforsvarligt at bruge store renoveringssummer. Udskiftningen er vurderet til ca. 3 millioner kr. Den anden er udarbejdelse af ny VVM og udledningstilladelse til HLR. Vurderes at beløbe sig til 2 millioner kr. 2025 og ca. det samme i 2026. Udgifter til dekanter og VVM deles med Rebild og Vesthimmerland, så MFV har ca. en nettoudgift på 2,8 millioner kr. i 2025.

Af forskellige årsager forventes flere anlægsprojekter at starte senere end forventet, hvilket medfører behov for at korrigere anlægsbudgettet for 2025. Disse projekter gennemgås nedenfor.

På Randersvej i Hobro udføres separatkloakering, renovering af vandledninger, udrulning af fjernvarme samt vejprojekt for fortov, cykelsti og be grønning af indfaldsvej til Hobro. Fasen med at afklare fordelingen af fællesomkostninger (belægning, trafikafvikling, arbejdsplads, koordinering, information mm.) har taget længere tid end forventet, men principperne for denne fordeling er nu faldet på plads, og den egentlige projektkoordinering med etapeopdeling, udførelsestakt og trafikafvikling starter igen her primo april. Samlet set betyder det, at anlægsarbejdet først kan starte i juni – evt. efter sommerferien, hvilket igen medfører at en del af den anlægsøkonomi, der er afsat i budgettet til udførelse i 2025 foreslås overført til 2026. Samlet foreslås overført 3,0 mio. kr. til næste budgetår.

Arbejdet med etablering af vakuumkloakering af sommerhusområdet syd for Als er startet op, men dog først i februar. Da der yderligere ikke må arbejdes i området i juli og august betyder det at der er for få anlægsmåneder til at nå at blive færdig med projektgennemførelsen. Det foreslås at overføre 4,0 mio. kr. ud af anlægsbudgettet for 2025 på 20,0 mio. kr. til afholdelse primo 2026.

Projektet ved Bramslev Bakker omfatter etablering af nye spildevandsledninger til forsyning af campingpladsen og restauranten ved Bramslev Bakker samt tilsvarende forsyning til Bramslevgaard. Yderligere etableres spildevandsforsyning til de ejendomme, som gravearbejdet passer undervejs. Der er nu afholdt licitation på projektet, og denne var lidt dyrere end forventet. Anlægsbudgettet foreslås øget med 1,0 mio. kr. som ny anlæg.

I Hadsund har der på projektet Fjordgade og Koldbæksgade været udfordringer med fremdrift grundet store mængder tilstrømmende grundvand. Selve udførelsen har været indstillet her i 2025, for at finde den rigtige metode til at sænke grundvandet med. Forsinkelser og forskellige forsøg på at sænke grundvandet har medført behov for at øge projektets budget med ca. 2,5 mio. kr., hvilket hermed indstilles.

I Hobro forestår en separatvloakering af området ved Vestergade, V. Allé og Sønder Allé. Grundet det spændende projekt i Hobro med etablering af Midgårdsormen har MFV og MFK koordineret at MFV's anlægsprojekt udskydes til opstart i oktober, så alle gæsterne ikke generes af gravearbejde, omkørsler jordkørsel mm. Det betyder så også at anlægsbudgettet skal korrigeres for at en større del udføres i 2026. Samlet vurderes et behov for at overføre 4,5 mio. kr. af budgettet på 10 mio. kr. til 2026.

Endelig foreslås en mindre korrektion i forbindelse med omlægning af regnvandsledning samt etablering af bassin i forbindelse med etablering af værkstedscenter op mod motorvejen.

Myndighedskrav om at forsyne området med regnvandsafledning grundet drikkevandsinteresser har medført behov for etablering af regnvandsbassin, hvilket ikke oprindeligt har været budgetlagt. Denne udgift er nu indregnet og der foreslås en justering af budgettet med 0,7 mio. kr. i meromkostning til etablering af bassinet, herunder arealerhvervelse. Udgiften modsvares af et tilsvarende tilslutningsbidrag i fase I og der vil komme yderligere tilslutningsbidrag i de kommende faser, når grunde byggemodnes.

Gammelvej i Hobro (sidevej til Hegedalsvej) er fællesvloakeret og er sluttet til det separate spildevandssystem uden forsinkelse under regnvejr. En separatvloakering af Gammelvej vil give en god aflastning for spildevandssystemet i den lavtliggende del af Hobro. Det indstilles til bestyrelsen at MFV dels igangsætter udarbejdelse af projektforslag til separering af hele eller dele af Gammelvej samt undersøger mulighederne hos bl.a. MFK for at gennemføre projektet her i 2025. En separering af den del af Gammelvej, der har afløbsretning mod Hegedalsvej vil ligge i størrelsesordenen 2,0 mio. kr., og yderligere 1,5 mio. kr. hvis den del af Gammelvej og Udsigten, der leder mod Hostrupvej også separeres. Når mulighederne er afdækket, vil punktet blive forelagt – forventet på førstkomende bestyrelsesmøde.

For VAND er den store reduktion i budget 2025, en udskydelse i udbygningen af Skellerup Vandværk med ca. 2 millioner kr. til budget 2027.

Direktionen indstiller:

- **At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning og godkender opdateret estimat på anlægsbudget 2025:**
- **For Vand på 4,6 mio. kr. mod tidligere 7,4 mio. kr. o For Spildevand på 104,5 mio. kr. mod tidligere 106,2 mio. kr.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:

Indstillingen godkendt, med tilføjelse af at der ønskes en "skarpere" budgetlægning, hvis muligt.

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 14 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)

Hadsund

De kommende år vil anlægsaktiviteten i Hadsund være forholdsvis høj. Det skyldes primært udfordringer med kælderopstuvninger i de lavtliggende områder tæt ved fjorden.

Fjordgade og Koldbæksgade - separatkloakering

Det første separerings- og klimatilpasningsprojekt i Hadsund ved Fjordgade og Koldbæksgade er startet i august 2024. I forbindelse med separering etableres ny spildevandspumpestation ved Østre Allé samt 2 regnvandspumpestationer ved hhv. Munchs Eng og Fjordgade. Begge pumpestationer skal sikre, at regnvandsudløb også kan ske under høj vandstand i fjorden. Projektet vil ud over regnvand også afskære en del drænvand, som i dag ledes til renseanlægget.

Aktuelt er udløbsledningen på Munchs Eng etableret, regnvandssumpen er sat, og spildevandspumpestationen ved Ø. Allé er også etableret. Ledningerne i Østre Allé og Fjordgade er udført – tilbage forestår arbejdet med separate ledninger i Koldbæksgade. Når ledningsanlægget er udført, skal den eksisterende pumpestation i Fjordgade ombygges til regnvandspumpestation.


Entreprenøren er udfordret af at der er rigtig meget grundvand i området. Aktuelt har det været nødvendigt at holde inde med anlægsarbejdet for at få tid til at fastlægge metoden for at få sænket grundvandet i Koldbæksgade tilstrækkeligt. Aktuelt er metodikken til afsenkning af grundvandet i gang, og det ser ud til at en kombination af sugespidsanlæg med større pumpe / lensebrønde kan løse opgaven. Gravearbejdet forventes at kunne starte igen ultimo marts / primo april, hvilket igen betyder at projektet samlet vil være afsluttet i maj måned.

Nedenfor ses det aktuelle projektstade, hvor fuldt optrukket linje angiver at ledninger er etableret, mens stiplede linjer er ledninger der mangler at blive udført. Byggepladsen på Munchs Eng er rømmet og flyttet til anden lokalitet.



Tykkenkærvej, Jernbanegade m.fl. – separatkloakering


I området ved Tykkenkærvej, Jernbanegade og Østergade, hvor der er udfordringer under kraftig regn – og hvor der er holdt borgermøde herom i foråret 2024 - er arbejdet med projektering godt i gang ligesom forundersøgelser med geoteknik og stikundersøgelser er udført. Projektet står til udførelse over 3 etaper i 2025-27 (det sortskraverede område nedenfor)

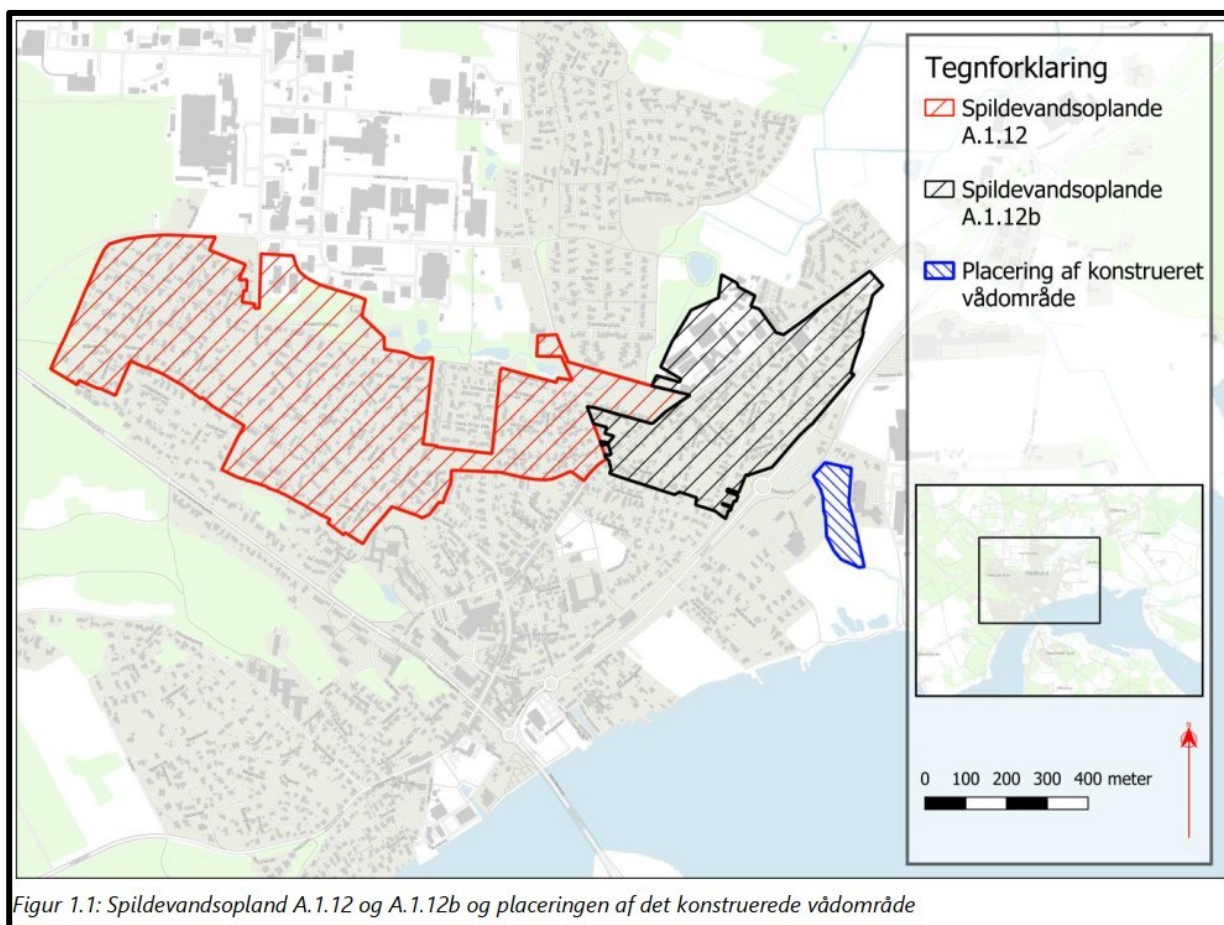

Aktuelt har MFV gang i en konstruktiv dialog med MFK omkring rensningen af regnvandet inden udledning til fjorden. I stedet for et traditionelt vådt bassin arbejdes der med etableringen af et ”konstrueret vådområde”, hvor regnvandet renses i et mindre forbassin for herefter at blive ledt ud i et terrænnært område, hvorfra det dels nedsiver og dels ledes gennem passager inden udledning til fjorden. Mellem forbassin og område til vådområde er der plads til dige til klimasikring af det bagvedliggende urbane område, herunder også etablering af regnvandspumpestation til klimasikring for afledning af regnvand ved høj vandstand i fjorden.


Dialogen omkring indretning af området er igangværende med MFK, og det er forventningen at myndighedsarbejdet inkl. dispensationer kan udføres i den første halvdel 2025, således af MFV kan udføre nyt overløbsbygværk ved pumpestationen på Stadionvej og ny separat regnvandsledning fra Stadionvej til Rolighedsvej og Jernbanegade sydvest for Rolighedsvej i 2025.

På principskitsen nedenfor ses, hvorledes det konstruerede vådområde kunne se ud. Området er af hensyn til naturbeskyttede områder og strandbeskyttelseslinje trukket så tæt på Stadionvej som muligt. Der pågår en tilpasning af projektet, således der samtidig tages hensyn til de vedtagne lokalplaner for området.

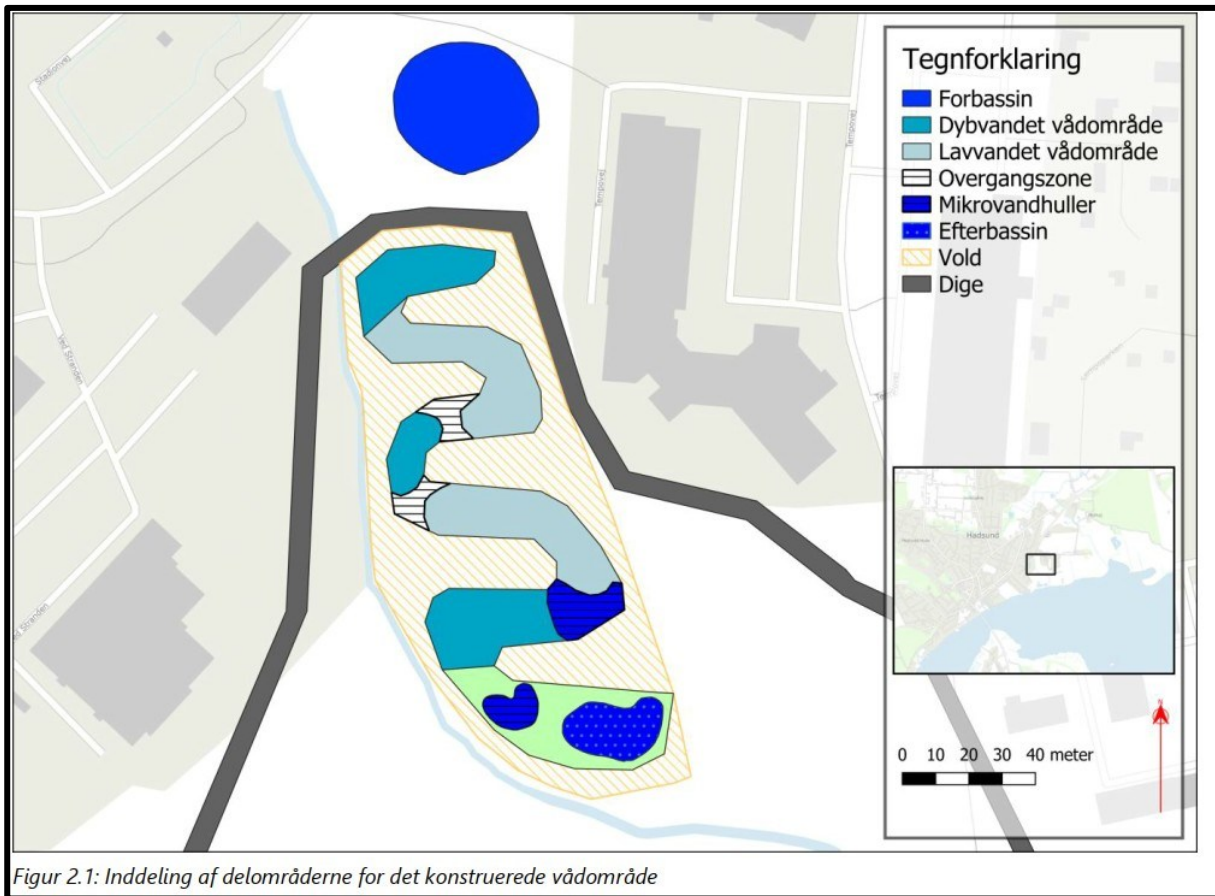

Fiskerihavnsvej og Bådsstræde - separatkloakering

I 2026 separatkloakeres Fiskerihavnsvej og Bådsstræde, begge fjordnære områder med regnvandspumper som klimasikring samt en ny spildevandspumpestation. I øjeblikket revurderes skitseprojektet bl.a. på baggrund af den markante grundvandssænkning, der pt. foretages i Fjordgade og Koldbæksgade projektet.

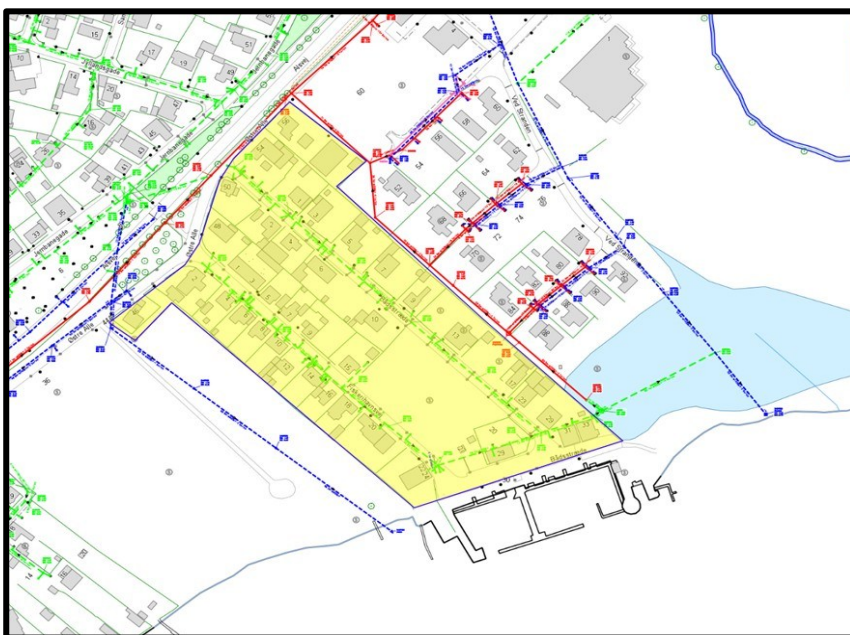

Regnvandspumpestation Havnegade

Endelig etableres der en ny regnvandspumpestation vest for broen ved Havnegade i Hadsund – en pumpestation, som mens området stadig er fælleskloakeret, skal hjælpe til med udpumpning af overløbsvand, hvis niveauet i fjorden er højt. Pumpestationen, som så også er den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring, forventes etableret i 2025. Arbejder med at fastlægge forudsætninger for fremtidig pumpeydelse – herunder struktur for separeringen af det lave område vest for broen - er netop startet op. Også her har RFM fokus på at fastlægge et system, hvor gravedybde holdes til et minimum grundet den høje grundvandstand.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:

Indstillingen godkendt.


V 15 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)

Fremover vil nærværende punkt hedde ”Separatkloakering og klimatilpasning Hobro”, som de også hedder for Hadsund og Mariager, da punktet omfatter alle opgaver der udføres i Hobro.

Hobro syd

Separatkloakering af Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) er efter 1½ års anlægsarbejde afsluttet og afleveret.

Næste etape – separering af del af Sallingvej, Møllebakken og Himmerlandsvej – er nået rigtig langt. Således er både vandledningsarbejder og kloakarbejder udført, og i øjeblikket pågår fortovsarbejder i Sallingvej og fjernvarmearbejder i Møllebakken. Samlet afsluttes projektet primo maj måned.

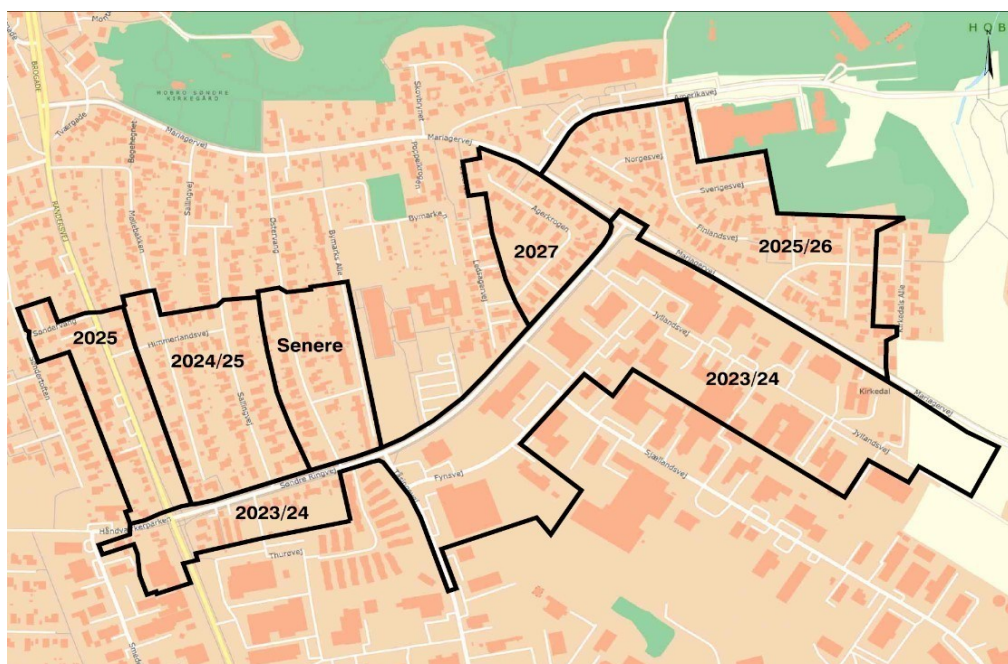

Koordineringsarbejdet i projekt Randersvej har pågået primo 2025. Kommunens vejprojekt integreres i ledningsprojektet, hvor ledningsplacering har været fastlagt et stykke tid. Efter en del dialog er ledningsejere og kommunens vejafdeling nu enige om principperne for fordeling af de fælles udgifter, som alle parter drager nytte af ved gennemførelse af flere arbejder samtidigt. Arbejdet vil starte lige omkring sommerferien 2025, og forventes at løbe ind i 2026. Trafikken forventes opretholdt i 2 spor, mens arbejdet gennemføres.


I Norgesvej, Finlandsvej og Kirkedals Allé m.fl. arbejder Hobro Varme pt. med udrulningen af fjernvarme. Separatkloakeringen gennemføres over 2 år og starter forventet i juni måned i Kirkedals Allé, herunder med etablering af ny regnvandsledning fra bassinet på Jyllandsvej til Kirkedals Allé.

Bassiner

Som et led i separatkloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelsesbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Der pågår en konstruktiv dialog med Mariagerfjord Kommune (spildevand, vandløb og natur) om udarbejdelse af bassinplan for området – med afsæt i en robusthedsanalyse af vandløbet

Kirkedalsbækken. Forventningen er, at der skal etableres følgende bassiner i oplandet fra Hobro Syd:

- Det eksisterende regnvandsbassin ved Jyllandsvej / Mariagervej skal ombygges til et stort bassin med permanent vandspejl. Dette bassin betjener langt det største areal i området (grønt område)
- Ved Amerikavej øst for vandrehjemmet etableres et mindre bassin med permanent vandspejl for det turkise opland
- Også ved Amerikavej lige øst for Kirkedalsbakken etableres bassin, om muligt med permanent vandspejl – det gule opland
- Endelig etableres 2 mindre bassiner, dels et tørt opstuvningsbassin samt et efterpoleringsbassin i slugten mellem Mariagervej og Amerikavej (det lilla opland). Da disse bassiner ligger naturskønt tilpasses design, så de æstetisk tilpasses så de syner mindst muligt i området
- Endelig skal der etableres bassin ved Blåkildevej (på et senere tidspunkt) vist med rødt nedenfor.

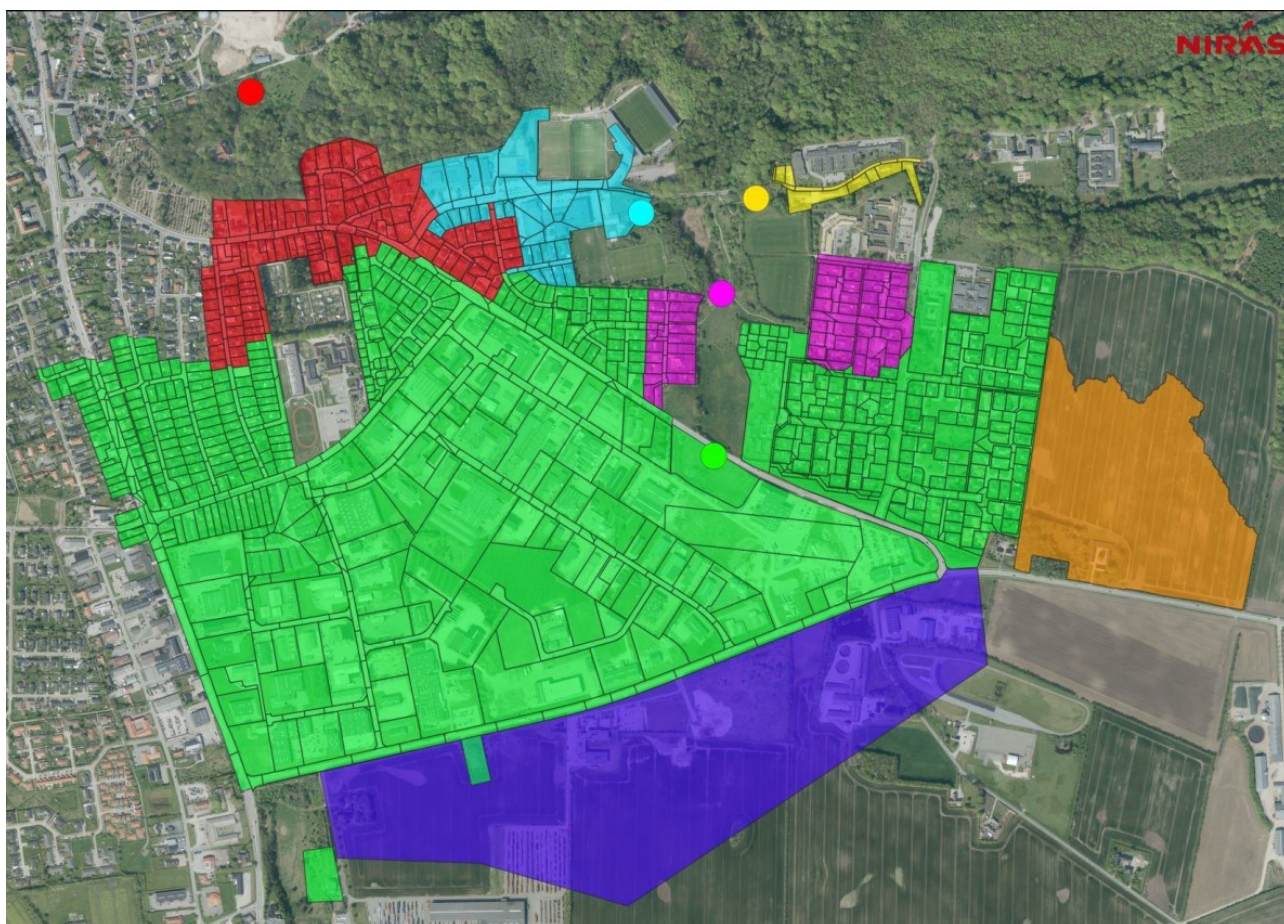

Ombygningen af det eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra tørt til vådt bassin forventes påbegyndt i august 2025.

Endelig er der igangsat en undersøgelse af området ved Andrup / Randersvej syd for Hobro med henblik på at lokalisere uvedkommende vand. Der er modtaget flere henvendelser fra ejendomme på Thurøvej, Tåsingevej og også Sdr. Ringvej om høj vandstand i spildevandssystemet med deraf udfordringer med afledning af spildevand. Analyse af pumpedata fra området viser en del uvedkommende vand til pumpestationen. Vores fejlkoblingsdetektiver har allerede lokaliseret fejlkoblinger i området, hvor påbud skal udstedes af myndigheden. Efter afklaringen, vil der blive udført en sanering af pumpestationerne på Randersvej og Andrup, for at optimere det hydrauliske flow ned til Gasværksvej.

Hobro - nordvest

I Hobro – i den nordvestlige del – gennemføres separering af Løgstørvej og Ølsvej. I projektet separeres den sidste del af området, hvorved et eksisterende overløbsbygværk kan sløjfes. Området er vist på nedenstående skitse, idet dog arbejdet fortsætter til maj 2025.


Anlægsarbejdet pågår i Ølsvej og mangler alene knap 100 m separatkloak. Arbejdet med bassin nord for Løgstørvej er også i gang.



Hobro - sydvest

I 2025 forventes arbejdet ved og omkring Vestergade / V. Allé at starte op.

Arbejdet forventes dog først at starte op i oktober 2025 grundet koordineringen med projekt Midgårdssormen, som forventes at trække mange mennesker til Hobro og i det område, som RFM skal grave i.

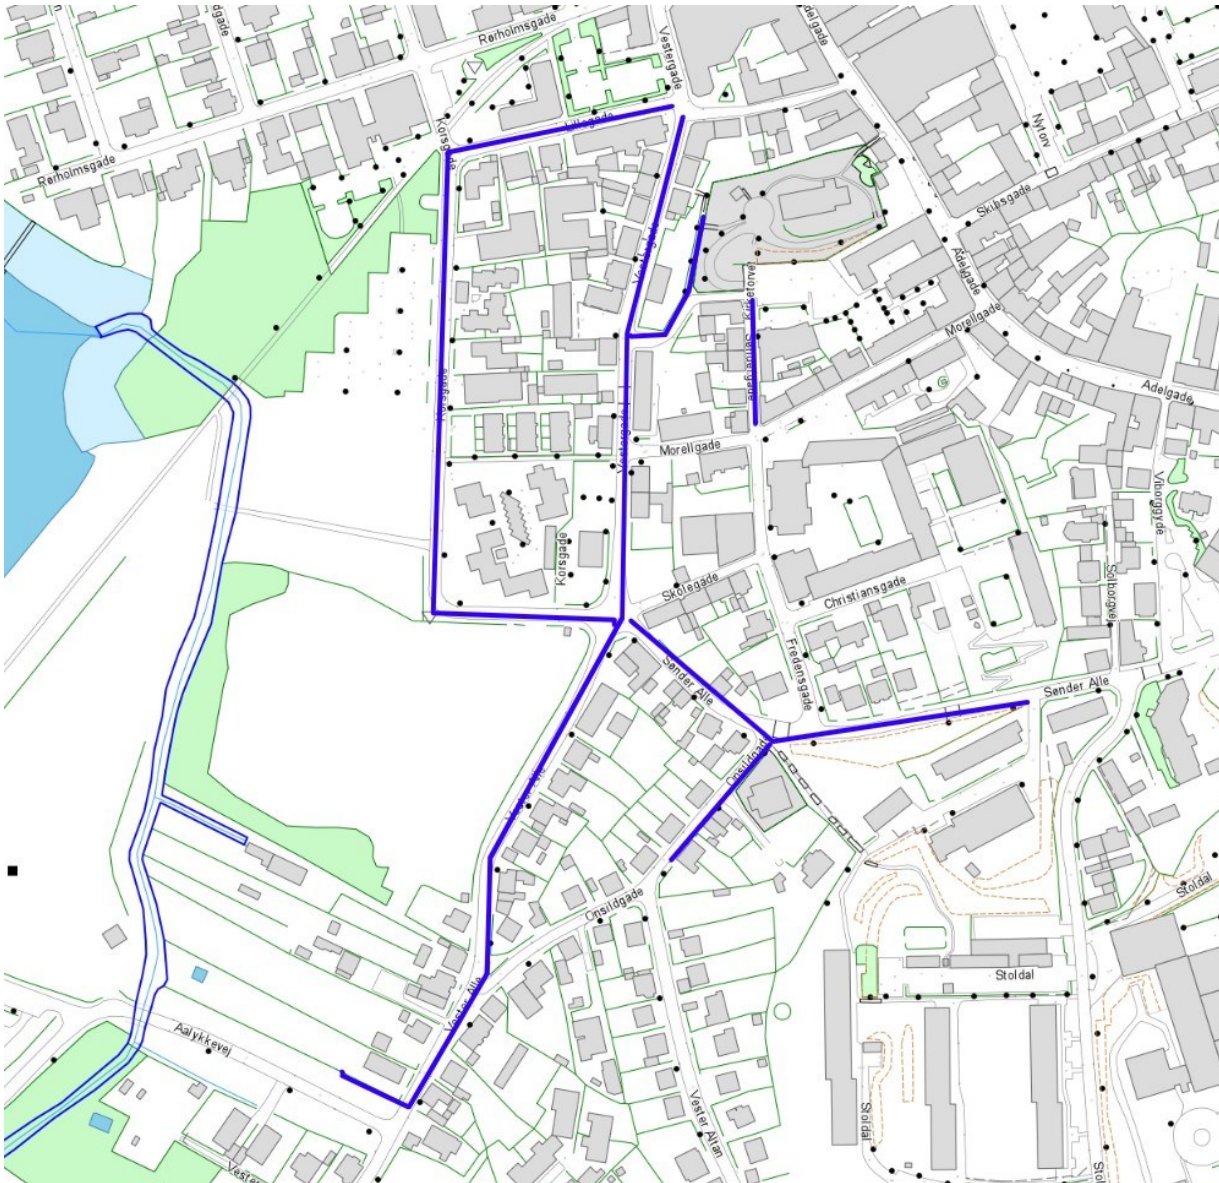

Direktionen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Indstillingen godkendt, med tilføjelse af, at de afleverede arbejder kvalitetssikres før aflevering.

V 16 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)

Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager

I den 1. etape er der etableret en regnvandspumpestation på havnen, umiddelbart ved siden af det eksisterende overløbsbygværk. Regnvandspumpestationen skal dels aflede overfladevand fra Rosengade, Havnegade og Havnevej og dels sikre funktionen af overløbsbygværket, da det er disse områder der ligger lavere end kote 2. Anlægsarbejdet er udført, og pumpestationen er i drift.

Etape 2 kommer til at omfatte separatkloakering af Rosengade, Havnevej og den vestlige del af Havnegade. Opstart forventes til maj i 2025. Projektet fortsættes og afsluttes i 2026. Tillæg til Spildevandsplanen er udarbejdet for separatkloakering af de fælleskloakerede områder. Påtænkt etapeopdeling er vist nedenfor. Der er fokus på koordineringen af arbejderne i Fjordgade og så cykelløbet PostNord Danmark Rundt, der køres i bl.a. Mariager den 16/8 2025.

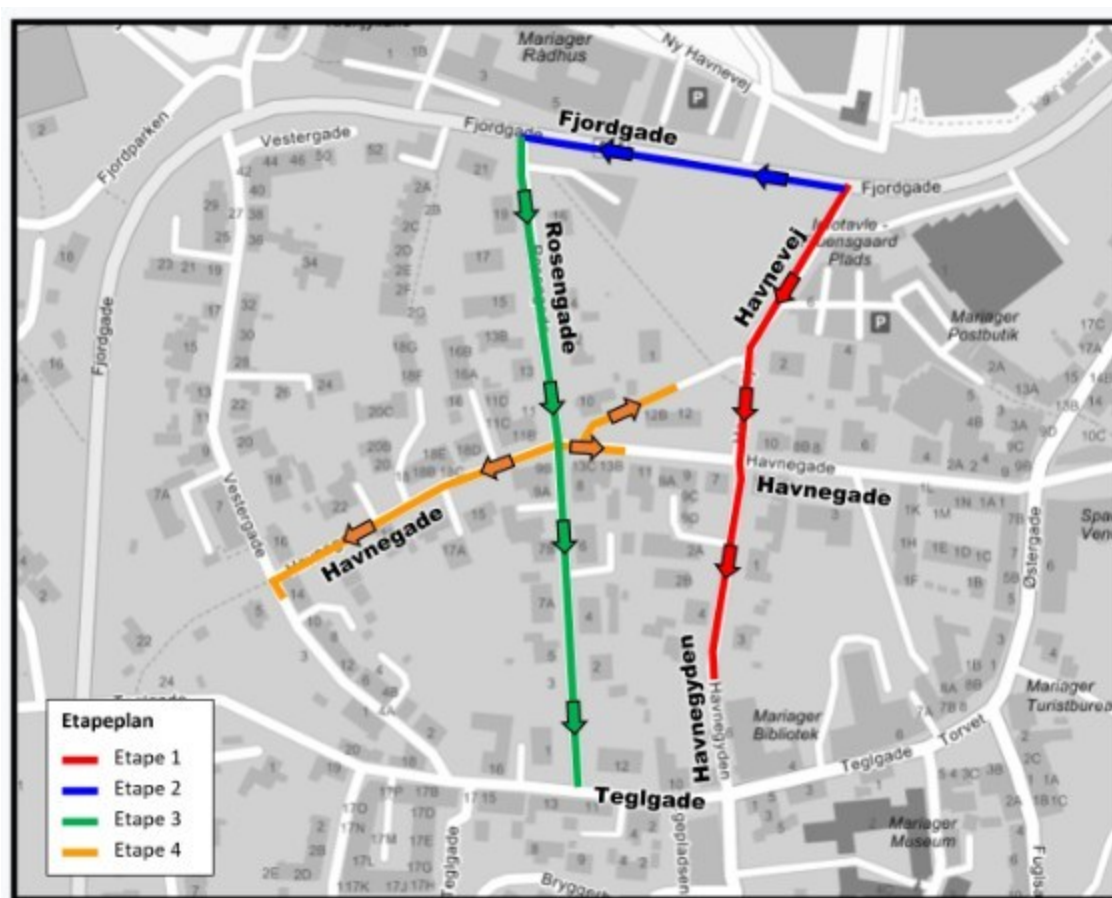

Der påregnes etaper i Mariager frem til og med 2029.

Direktionen indstiller:


- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Indstillingen godkendt.

V 17 - Sommerhuskloakering (Åben)

Sommerhuskloakering syd for Als

Arbejdet med gennemførelse af etape 1 er påbegyndt i februar måned 2025. Det er entreprenørfirmaet Karl Jensen A/S fra Hobro, der var lavestbydende på graveentreprisen, mens firmaet Qua-vac vandt EU udbuddet på selve vakuumdelen. Qua-Vac har også leveret vakuumpumper og vakuumpotter for området ved Øster Hurup.

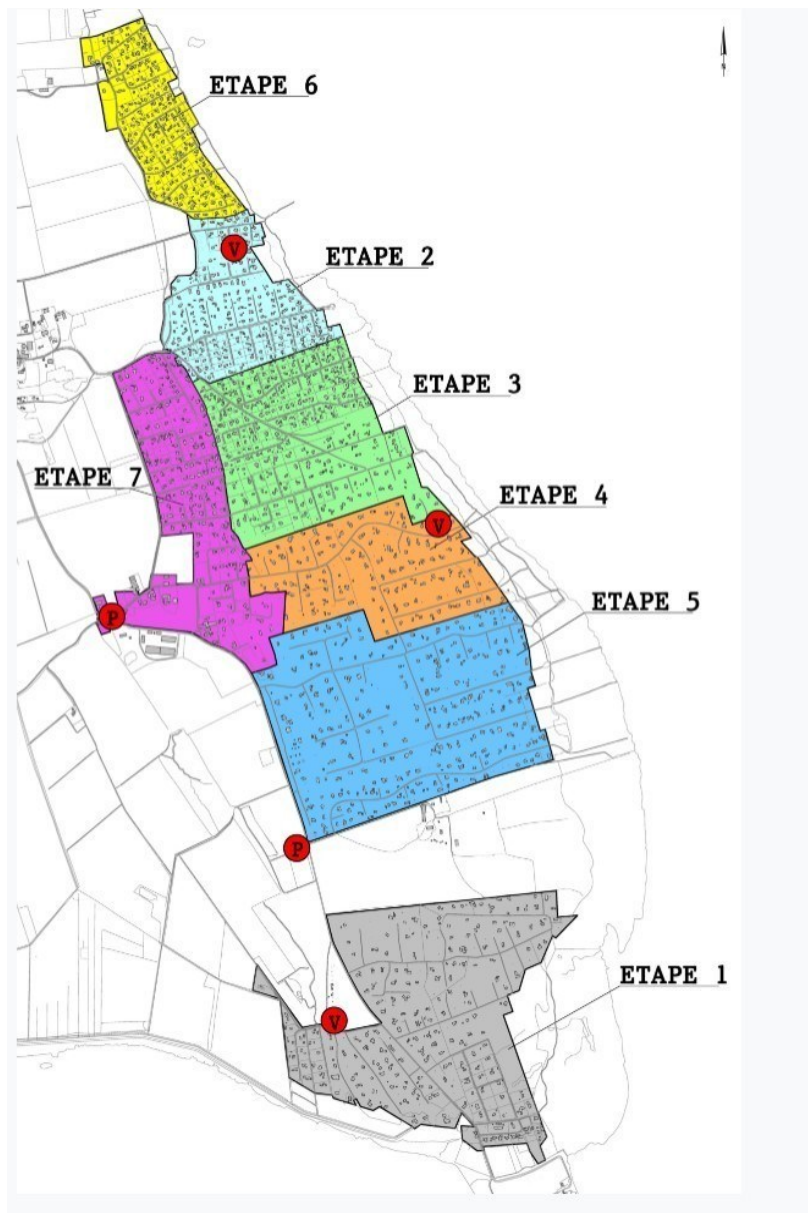

Entreprenøren er nu kommet godt i gang, og fokus har indledningsvist været udgravning og støbearbejde for den store vakuumstation, der skal ligge på arealet ved det nu nedlagte renseanlæg. Selve kælderen er nu støbt og arbejdet med overbygningen påbegyndes i april. Parallelt herved graves vakuumledninger og -potter i jorden, aktuelt i området Fjordblink øst for Als Oddevej. Vakuumstationen forventes idriftsat ultimo 2025.

Grundet den lidt senere opstart end forventet (skulle være startet i november 2024) vil udførelsen strække sig lidt ind i 2026. I dagsordenpunktet ”opfølgning og korrektioner til anlægsbudget 2025” er det således foreslået at overføre 4,0 mio. kr. til afholdelse primo 2026.

De forberedende arbejder for etape 2 og etape 3 er allerede i gang med opmåling af septiktanke samt dialog med lodsejer vedr. placering af Vakuumstation 2 og 3. Første entreprise i etape 2 skal projekteringsmæssigt afsluttes ultimo 2025, så anlægsarbejderne kan starte primo 2026. Der er aftalt endelig placering af vakuumstationen i etape 2 mens det forventes nødvendigt med ekspropriation for placeringen af vakuumstationen i etape 3.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Indstillingen godkendt.

V 18 - Udbygning Skjellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)

Udvidelsen af Skjellerup vandværk, som i første omgang omfatter etablering af to nye indvindingsboringer med en samlet kapacitet på 500.000 m³/år, er i afventning på tilladelse til etablering af boring nr. 2, som er flyttet ca. 200 meter mod syd, i forhold til oprindelig placering.

Boring 2 og undersøgelse og godkendelse som indvindingsboringer for begge boringer, forventes at pågå året ud. På den baggrund forventes de afsatte budget 2025 reduceret med 2 millioner kr. som flyttes til budget 2027 og bibeholde budget 2026.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Indstillingen godkendt.

**V 19 - Dagsorden til generalforsamlingen d. 30. april 2025 (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

V 20 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 20 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

V 21 - Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:

Intet at bemærke.

V 22 - Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2025

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt. Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 6. januar 2025 (Bestyrelsesmøde - konstituering af ny bestyrelse)

Mandag den 31. marts 2025 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2024)

Onsdag den 30. april 2025 (Ordinære generalforsamlinger 2025)

Mandag den 16. juni 2025 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 1. september 2025 (Bestyrelsesmøde - Budget 2026) Mandag den 27. oktober 2025
(Bestyrelsesmøde - takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:

Taget til efterretning.

V 23 -. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

V 08 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)

V 09 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

V 10 - Årsregnskab 2024 for MFV (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 11 - Budgetopfølgning pr. 28. februar 2025 (Åben)

V 12 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben)

V 13 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 14 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben) V 15 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)

V 16 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)

V 17 - Sommerhuskloakering (Åben)

V 18 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)

V 19 - Dagsorden til generalforsamlingen d. 30. april 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 20 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 21 - Eventuelt (Åben)

V 22 - Næste møde (Åben)

V 23 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne V 10, V 13, V 19 og V 20 holdes som lukket.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 31. marts 2025:
Indstillingen godkendt.



**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
31. marts2025**

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Bestyrelsesmedlem, Jesper Skov Mikkelsen

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Medarbejderrepræsentant, Kim Baade Christiansen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Preben Weller
